


## 邦讯施工队本地调测操作手册(含本地告警测试)

### 一、准备工作

笔记本电脑一台，需提前安装好谷歌浏览器（群共享里已上传）



电脑 IP 配置如下图：

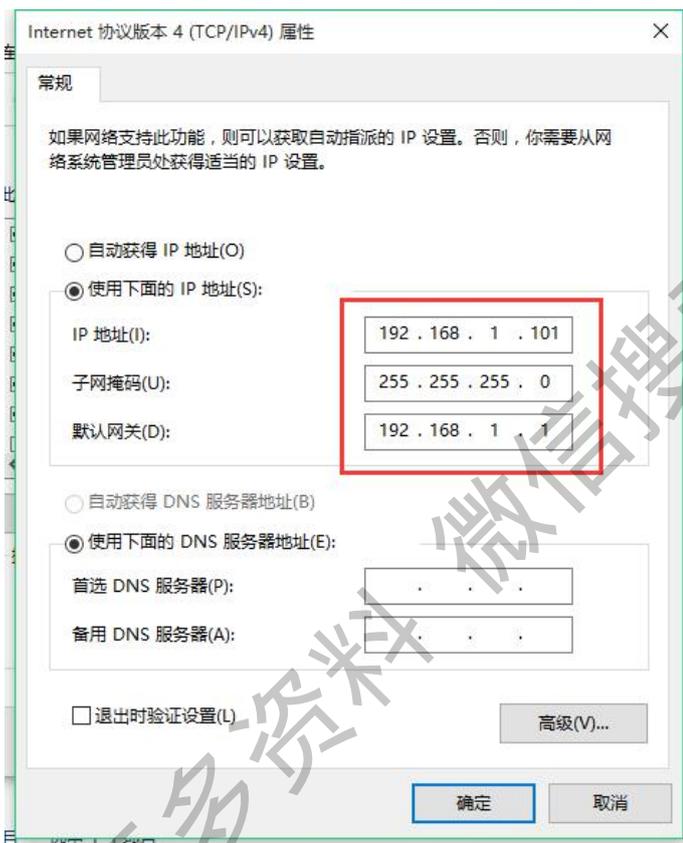

二、到站后发送站名到 QQ 群，督导回应接单后请私聊督导，拍摄 6 张照片（空调正面照、智能电表正面照、开关电源正面照、开关电源监控模块照、开关电源整流模块照、开关电源型号照）传给本地督导，需注明**站点名称**，督导会回传需要当前基站导入 FSU 的文档，以下是样照：

**DELTA**  
**高频开关电源系统**  
 型号: MCS3000E-48/50  
 机种号: ESFC600-KDD03  
 执行标准: Q/TENJ 1  
 输入: 3N 380V ~ 50Hz 64Amax  
 输出: 54V = 600A  
 生产日期: 2015年07月02日

中达电通股份有限公司  
 Delta GreenTech (China) Co., Ltd.  
 客服热线: 400-820-9595  
 www.deltagreentech.com.cn

15

PR001570026077  
 811E1502500

### 模块位置说

模块1	模块2	模块3	模块4
模块7	模块8	模块9	模块10






三、 给模块插入 SIM 卡,并同时把**模块品牌、SIM 卡运营商、卡号、蓄电池组数量、空调数量、铁塔类型**等信息提供给督导。

四、 本地 FSU 设备升级及数据导入:

FSU 设备通电后,用网线连接电脑,通过谷歌浏览器访问 192.168.1.100

这个网址会出现如下界面:

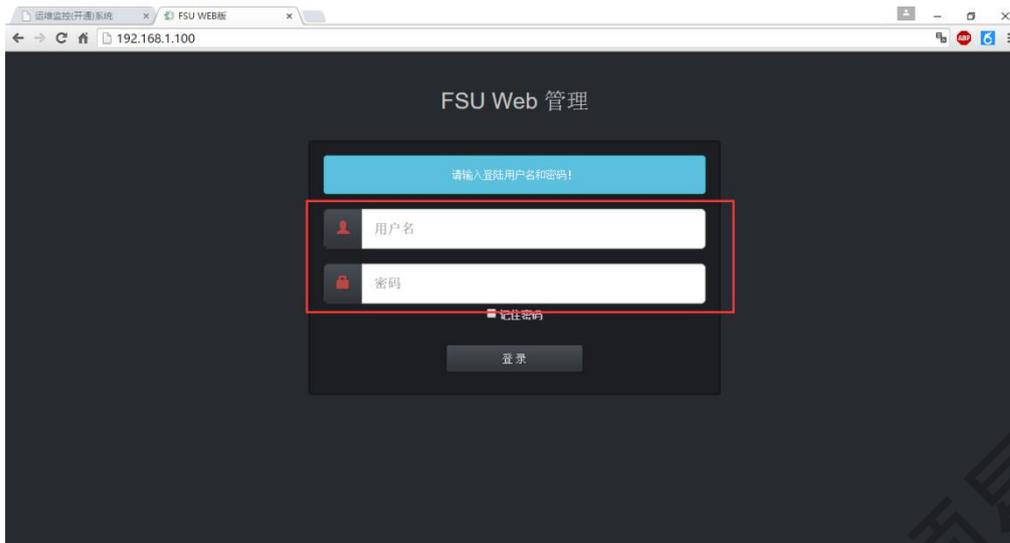


输入用户名: **admin**

输入密码: **bonson@2015**

登陆后做如下两部操作:

1. 如下图顺序依次点击, 选择文件时选择附件中的 **DCD8030W.bin** 文件然后上传, 上传后会重启, 然后重新登录进行下一步

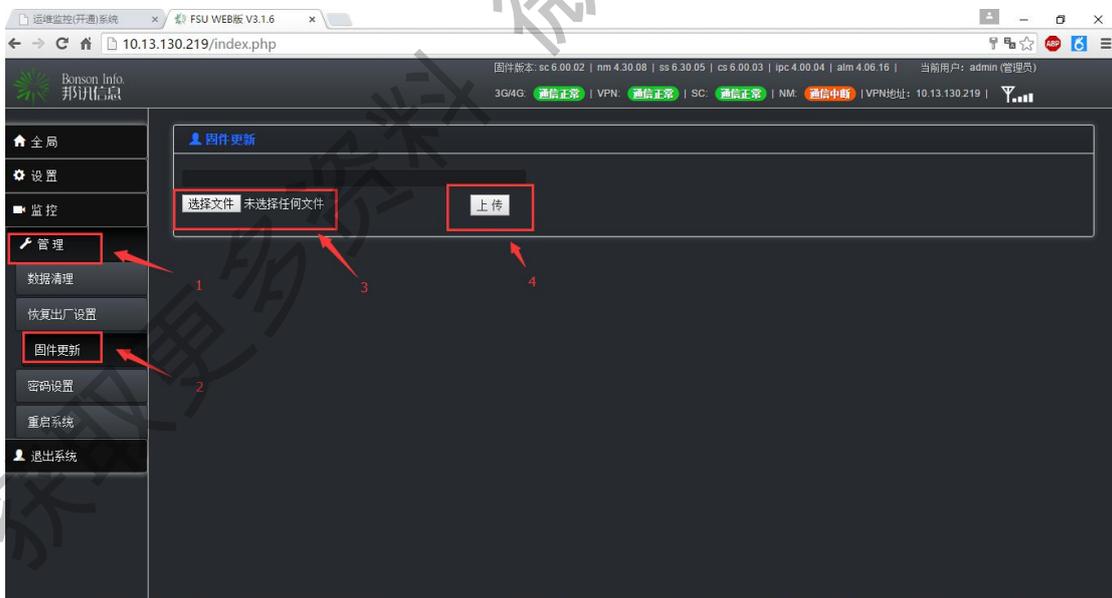

2. 导入基站数据, 根据督导下发的每个站点表格进行导入。



导入后 FSU 设备会重新启动，需要重新登录

## 五、 设置串口：

进入 192.168.1.100 主页面



点击设置一串口，按现场要求更改如上设备对应协议（点击对应行修改按钮修改），如不清楚，请参考群共享文件《看智能设备图选动态库》或查看基站设备标签。

## 六、 查看本地数据是否正常：

编号	使能	信号ID	信号名称	采集值(单位)	采集时间	告警级别	备注	历史数据
1	✓	0406001001	电池01熔丝故障告警	正常	2015-12-27 22:27:50	正常	电池01熔丝故障告警正常(0)	查看
2	✓	0406002001	电池01充电过流告警	正常	2015-12-27 22:27:50	正常	电池01充电过流告警正常(0)	查看
3	✓	0406003001	电池01温度过高告警	正常	2015-12-27 22:27:50	正常	电池01温度过高告警正常(0)	查看
4	✓	0406005001	电池供电告警	正常	2015-12-27 22:27:50	正常	电池供电告警正常(0)	查看
5	✓	0406008001	直流输出电压过低告警	正常	2015-12-27 22:28:30	正常	直流输出电压过低告警正常(54.93)	查看
6	✓	0406009001	直流输出电压过高告警	正常	2015-12-27 22:28:30	正常	直流输出电压过高告警正常(54.93)	查看
7	✓	0406014001	交流输入第1路A相电压过高告警	正常	2015-12-27 22:27:50	正常	交流输入第1路A相电压过高告警正常(0)	查看
8	✓	0406015001	交流输入第1路A相电压过低告警	正常	2015-12-27 22:27:50	正常	交流输入第1路A相电压过低告警	查看

1. 点击监控-设备，每个设备去查看（除灯控及摄像头），测点是否正常。如无数据请查阅群内文件《智能设备安装指导》进行测试和调整；如常，则本地数据 OK，可以通知本地工程督导远程交维。

2. **摄像头必须调整图像位置**，具体方法如下：

使用 IE 浏览器，地址栏输入 IP: 192.168.1.64 会出现如下界面：

输入用户名: **admin**

输入密码: **admin1234**

登陆后界面如下：



调整摄像头至合适位置：水平并视野最大化。

六、本地测试告警需要做如下：

烟感（两种测试方法，一种按 TEST 按钮，一种吹烟，FSU 端查看有烟感告警）

红外（人在红外边走动产生告警，FSU 端查看有红外告警）

水浸（用线把水浸片两边短路产生水浸告警，FSU 端查看有水浸告警）

停电（断掉开关电源的交流输入产生告警，FSU 端查看有停电告警。

注：拉电前请咨询代维或监理可不可以停电）

防雷器故障告警（关掉防雷空开或拔掉防雷器，查看现场 FSU 平台里开关电源是否产生告警）


整流模块故障告警（关掉整流模块空开或拔出整流模块，查看现场 FSU 平台里开关电源是否产生告警）

另外浮充电压设定值（远程设定：工程督导远程操作）

本地告警能在 FSU 上查看到后，就可以通知工程督导远程交维了。

交维过程：

确保本地数据全部调测无误，告警已经获取到，在 QQ 群里发送站名申请交维，督导接单后私聊督导通讯模块品牌厂家，并发送一键交维测试图片给督导，例图：

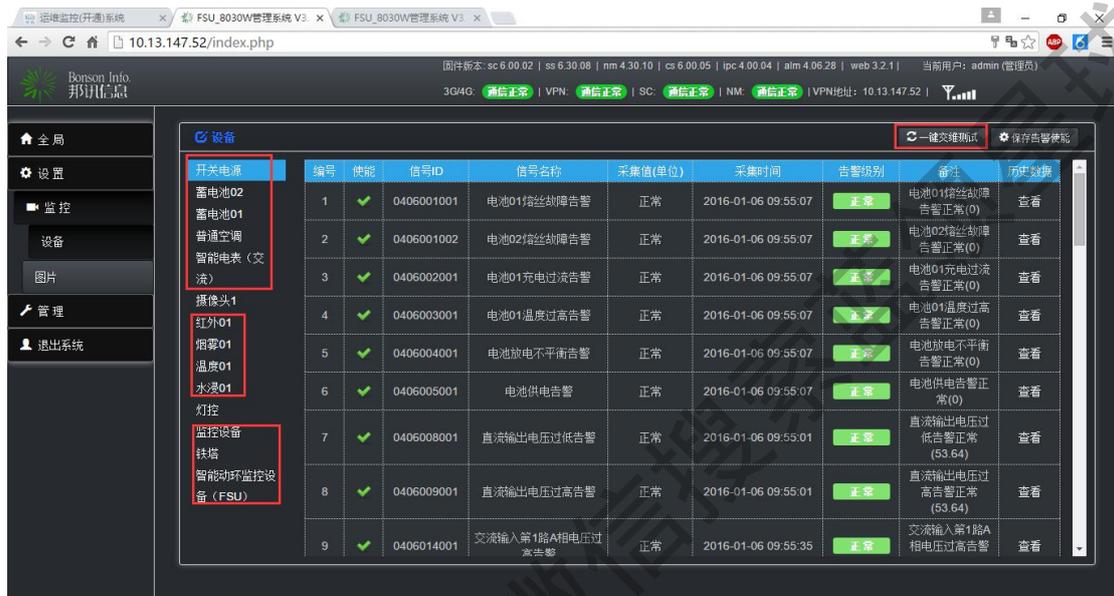

需保证红框中数据全部不能为空，然后点右上角：一键交维测试，然后发送如下三张图给接单的督导。



ID	设备名称	设备ID	检测项目	检测值	状态
13	蓄电池02	0407107001	后半组电压	26.55	通过
14	蓄电池01	0407102001	总电压	53.66V	通过
15	蓄电池01	0407106001	前半组电压	26.89	通过
16	蓄电池01	0407107001	后半组电压	26.78	通过
17	普通空调	0415001001	工作异常告警	正常	通过
18	普通空调	0415102001	回风温度	14.00°C	通过
19	智能电表(交流)	0416001001	交流输入停电告警	正常	通过
20	智能电表(交流)	0416104001	A相电压Ua	227.27V	通过
21	智能电表(交流)	0416105001	B相电压Ub	227.08V	通过
22	智能电表(交流)	0416106001	C相电压Uc	228.64V	通过
23	红外01	0418003001	红外告警	正常	通过
24	烟雾01	0418002001	烟雾告警	正常	通过
25	温度01	0418101001	温度	13.51°C	通过
26	温度01	0418102001	湿度	79.91%RH	通过
27	水浸01	0418001001	水浸告警	正常	通过
28	铁塔	0437111001	经度	121.467300°	通过
29	铁塔	0437112001	纬度	29.885500°	通过

Benson Info. BS-IPC-130

预览    回放    日志    配置    admin | 注销

子码流    主码流    Webcomponents

11-18-2015 星期三 21:03:20

Camera 01

获取更多
